

新建柿树岗乡新街社区整村推进项目（新街安置点）

水土保持监测总结报告

建设单位：肥西县柿树岗乡人民政府

监测单位：安徽鑫成水利规划设计有限公司

2023 年 11 月

			
统一社会信用代码 91340100092141782B(1-1)	营业执照 (副本)		扫描二维码登录 “国家企业信用 信息公示系统” 了解更多登记、 备案、许可、监 管信息。
名称 安徽鑫成水利规划设计有限公司	注册资本 伍佰万圆整		
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期 2014年01月26日		
法定代表人 胡瑾	营业期限 2014年01月26日至2044年01月23日		
经营范围 水利水电工程设计及测绘;工程造价咨询;水土保持方案编制、水土保持监测及验收咨询;防洪影响评价;水文、水资源调查评价;水资源论证;入河排污口论证;建设项目环境影响评价;水生态环境综合治理咨询;水生态监测及评价;水利工程质量检测;无人机遥控及影视制作咨询;计算机软件开发及应用;信息系统开发及应用管理;工程资料整编咨询;图文设计制作;展会及会务咨询。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	住所 安徽省合肥市肥东县包公镇青春社区马定路与孙解路交口合肥双创产业园101室		
登记机关			
		2020年 09月 01日	







国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示

国家市场监督管理总局监制

	副本
质量管理体系认证证书	
安徽鑫成水利规划设计有限公司	
注册地址: 安徽省合肥市肥东县包公镇青春社区马定路与孙解路交口合肥双创产业园101室 生产/经营/办公地址: 安徽省合肥市滨湖新区徽州大道6669号滨湖时代广场C6幢2309-2315	
质量管理体系符合 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准要求 通过认证的范围为:	
水土保持方案编制、水土保持监测	
证书编号: 05319Q3078SR3S	首次发证日期: 2016年12月12日
有效期至: 2020年12月16日	证书有效期至: 2020年12月16日
上次监督审核日期: 2019年12月11日	再认证审核日期: 2019年12月02日至2019年12月03日
获证组织统一社会信用代码: 91340100092141782B	
本证书在国家规定的有效期内有效, 获证范围内一并使用方可有效 本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询 监督审核日期到期后, 本获证组织应接受监督审核, 此证书无效	
第一次评审	第二次评审
第一次监督审核	第二次监督审核
合格标志	合格标志
	
	总经理: 
认证机构注册地址: 北京市朝阳区新源大街5号2号楼10层207 电话: 010-59813000 邮编: 100708 网址: www.cng.org.cn 认证机构注册地址: 北京市朝阳区新源大街5号2号楼10层207 电话: 010-59813000 邮编: 100708 网址: www.cng.org.cn	

新建柿树岗乡新街社区整村推进项目（新街安置点）水土保持监测总结报告
责任页

编制单位	安徽鑫成水利规划设计有限公司		
分 工	姓 名	职位/职称	签 字
批 准	胡 瑾	高 工	
核 定	王亮保	高 工	
审 查	廖传淮	高 工	
校 核	余 浩	工程师	
项目负责人	连明菊	工程师	
编写人员			
姓 名	职 称	参编章节、任务分工	签 字
连明菊	工程师	前言、1、3 章节 附图、季报	
葛晓鸣	工程师	2、4、5 章节	
宋宇驰	工程师	6、7 章节	

水土保持工程照片

	
雨水口（2022 年 12 月）	雨水口（2023 年 9 月）
	
绿化区域（2022 年 12 月）	绿化区域（2023 年 9 月）
	
绿化区域（2023 年 2 月）	绿化区域（2023 年 9 月）



雨水井（2022 年 12 月）



雨水井（2023 年 9 月）




植草砖（2022 年 12 月）



植草砖（2023 年 9 月）



绿化区域（2022 年 9 月）

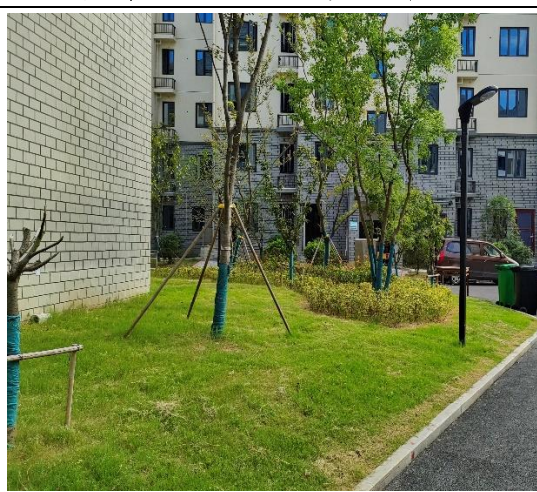

绿化区域（2023 年 9 月）



临时绿化（2022 年 3 月）



土质排水沟（2021 年 12 月）



浆砌砖排水沟（2022 年 3 月）



密目网苫盖（2021 年 12 月）



场外临建现状（2021 年 12 月）



场外临建现状（2023 年 9 月）



项目建设现状（2021 年 12 月）



项目建设现状（2022 年 3 月）



项目建设现状（2022 年 9 月）



项目建设现状（2022 年 12 月）



项目建设现状（2023 年 2 月）



项目建设现状（2023 年 9 月）

目 录

前 言	1
1 建设项目及水土保持工作概况	4
1.1 建设项目概况	4
1.2 水土保持工作概况	13
1.3 监测工作实施情况	13
2 监测内容与方法	19
2.1 扰动土地情况	19
2.2 水土保持措施	19
2.3 水土流失情况	20
3 重点部位水土流失动态监测结果	21
3.1 防治责任范围监测	21
3.2 取土（石、料）监测结果	23
3.3 弃渣监测结果	23
3.4 表土监测结果	23
3.5 土石方流向情况监测结果	23
3.6 其他重点部位监测结果	25
4 水土流失防治措施监测结果	26
4.1 工程措施监测结果	26
4.2 植物措施监测结果	27
4.3 临时防治措施监测结果	29
4.4 水土保持措施防治效果	30
5 土壤流失情况监测	31
5.1 水土流失面积	31
5.2 土壤流失量	31
5.3 取土（石、料）、弃土（石、渣）潜在土壤流失量	38
5.4 水土流失危害	38
6 水土流失防治效果监测结果	39



6.1 水土流失治理度	39
6.2 土壤流失控制比	39
6.3 渣土防护率	39
6.4 表土保护率	39
6.5 林草植被恢复率	40
6.6 林草覆盖率	40
6.7 水土流失防治六项指标监测结果	40
7 结论	42
7.1 水土流失动态变化	42
7.2 水土保持措施评价	42
7.3 存在问题及建议	43
7.4 综合结论	43

附件:

- 1、项目备案通知;
- 2、项目水土保持方案批复;
- 3、初设批复;
- 4、情况说明;
- 5、土方协议;
- 6、整改通知;
- 7、监测季度报告表及其他与监测工程相关的资料。

附图:

- 1、项目区地理位置图;
- 2、水土流失防治责任范围图及监测点位示意图;
- 3、水土保持措施布局图。

前言

新建柿树岗乡新街社区整村推进项目（新街安置点）项目位于肥西县柿树岗乡050县道以南、规划道路以东。项目共建设29栋住宅楼，6栋商业楼，1栋9班幼儿园，2座配电所等基础设施。项目总建筑面积112037.98m²，地上建筑面积112037.98m²。项目容积率1.04，建筑密度23.09%，绿地率32.10%。建设性质为新建。

本项目主要由主体工程区、场外临建工程区2个部分组成。工程总占地11.68hm²，其中永久占地10.82hm²，临时占地0.86hm²；工程共挖方16.18万m³，填方29.12万m³，无余方，借方12.94万m³，来自新建柿树岗乡联圩村整村推进项目（联圩安置点）；本项目由肥西县柿树岗乡人民政府建设。本项目于2021年3月开工，2023年3月完工。项目总投资为3.88亿元，其中土建投资1.16亿元。

2017年3月9日，项目取得肥西县发展和改革委员会的立项批复（发改投资字〔2017〕042号）。

2017年7月5日，项目取得肥西县环境保护局的《建设项目环保审查意见》。

2019年7月12日，项目取得中华人民共和国建设项目选址意见书。

2019年7月，西北综合勘察设计研究院完成了《柿树岗乡新街社区整村推进安置点项目岩土工程勘察报告》。

2019年7月，江西同济设计集团股份有限公司完成了《肥西县柿树岗乡新街安置点初步设计》。

2019年8月7日，项目取得安徽省人民政府《关于肥西县2019年第3批次（增减挂钩）城镇建设用地的批复》。

2019年9月19日，项目取得肥西县自然资源与规划局的建设工程方案审定通知书。

2019年12月13日，肥西县发展和改革委员会以“发改投资〔2019〕326号”对本项目初步设计进行了批复。

2019年12月，江西同济设计集团股份有限公司完成了《柿树岗乡新街社区整村推进安置点项目施工图》。

2021年8月，肥西县水务局下达《关于对水土保持疑似违规行为进行整改的通知》，要求建设单位按照水土保持要求，编报水土保持方案。2021年10月，肥西县柿



树岗乡人民政府委托安徽鑫成水利规划设计有限公司编制该项目水土保持方案，2021年12月31日，肥西县水务局以“肥水审批函〔2021〕104号”印发了《关于新建柿树岗乡新街社区整村推进项目（新街安置点）水土保持方案报告书的批复》。

根据《中华人民共和国水土保持法》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）等规定，肥西县柿树岗乡人民政府于2021年12月委托安徽鑫成水利规划设计有限公司（下面简称我单位）承担本工程的水土保持监测工作。我单位监测工作开展时项目正在进行建构筑物上部结构建设，主要采取调查、实地量测、资料分析、类比推算、遥感解译等监测方法，对各区域水土流失、水土保持防治措施及防治效果进行全面监测和补充调查，于2023年11月编制完成《新建柿树岗乡新街社区整村推进项目（新街安置点）水土保持监测总结报告》。

新建柿树岗乡新街社区整村推进项目（新街安置点）水土保持监测特性表

主体工程主要技术指标										
项目名称		新建柿树岗乡新街社区整村推进项目（新街安置点）								
建设规模		总建筑面积 365882m ²		建设单位、联系人		肥西县柿树岗乡人民政府、龚鹰鹏				
				建设地点		安徽省肥西县柿树岗乡				
				所属流域		长江流域				
				工程总投资		3.88 亿元				
				工程总工期		工程总工期 25 个月（2021 年 3 月~2023 年 3 月）				
水土保持监测指标										
监测单位			安徽鑫成水利规划设计有限公司			联系人及电话		王俊 18019574583		
自然地理类型			暖温带湿润季风气候区、北亚热带常绿阔叶林带			防治标准		南方红壤区二级标准		
监测内容	监测指标		监测方法(设施)			监测指标		监测方法(设施)		
	1、水土流失状况监测		遥感解译、调查监测、实地量测			2、防治责任范围监测		调查监测、实地量测		
	3、水土保持措施情况监测		调查监测、实地量测			4、防治措施效果监测		调查监测		
	5、水土流失危害监测		调查监测			水土流失背景值		380t/(km ² ·a)		
防治责任范围			11.68hm ²			容许土壤流失量		500t/(km ² ·a)		
水土保持投资			9000.06 万元			水土流失目标值		350t/(km ² ·a)		
防治措施	分区	工程措施				植物措施		临时措施		
	主体工程区	雨水管道6104m，雨水井306个，雨水调蓄池1个，植草砖0.46hm ² ，土地整治3.46hm ² 。				植被建设3.46hm ² （乔木2104株，灌木1690株，地被1.38 hm ² ，铺植草皮2.81hm ² ）。		土质排水沟 758m，浆砌砖排水沟 1267m，临时绿化 0.41hm ² ，密目网苫盖 26500 m ² ；		
	场外临建工程区	土地整治面积0.82hm ² 。				无		盖板排水沟 88m，混凝土排水沟 404m，临时绿化 0.03hm ² ，撒播草籽 0.32hm ² 。		
监测结论	分类指标目标值（%）		达到值（%）		实际监测数量					
	水土流失治理度	95	99.8	防治措施面积	3.46hm ²	永久建筑物及硬化面积	3.47hm ²	扰动土地总面积	11.86hm ²	
	土壤流失控制比	1.4	4.1	防治责任范围面积		11.86hm ²	水土流失总面积		11.86hm ²	
	渣土防护率	95	99.4	工程措施面积		0.83hm ²	容许土壤流失量		500t/(km ² ·a)	
	表土保护率	/	/	植物措施面积		3.46hm ²	监测土壤流失情况		350t/(km ² ·a)	
	林草植被恢复率	95	99.7	可恢复林草植被面积		3.47hm ²	林草类植被面积		3.46hm ²	
	林草覆盖率	22	30.9	实际拦挡弃渣量		6.80 万 m ³	总弃渣量		6.84 万 m ³	
				保护的表土数量		/	可剥离表土数量		/	
	水土保持治理达标评价		各项指标达到方案批复的防治要求，水土保持措施的防治效果较好							
	总体结论		本工程采取水土保持工程措施、植物措施以及临时措施相结合，形成较为完整的水土流失防治体系，起到了防治水土流失的效果。							
主要建议		建设单位加强对项目水土保持措施的后期管理及维护								

1 建设项目及水土保持工作概况

1.1 建设项目概况

1.1.1 项目基本情况

1、地理位置

新建柿树岗乡新街社区整村推进项目（新街安置点）肥西县柿树岗乡 050 县道以南、规划道路以东、规划道路以西，规划道路以南（经纬度坐标：经度 $116^{\circ}55'40.34''$ ，纬度 $31^{\circ}33'9.97''$ ），交通便利。项目地理位置详见图 1.1。



图 1.1 项目地理位置图

2、工程简况

项目名称：新建柿树岗乡新街社区整村推进项目（新街安置点）；

建设单位：肥西县柿树岗乡人民政府；

建设性质：新建；

建设规模：总建筑面积 112037.98m^2 ；

主体设计单位：江西同济设计集团股份有限公司；

水土保持方案编制单位：安徽鑫成水利规划设计有限公司；

施工单位：安徽四建控股集团有限公司；

监理单位：安徽南巽建设项目管理投资有限公司；

工程占地：工程总占地 11.68hm²，其中永久占地 10.86hm²，临时占地 0.82hm²；

土石方量：工程总挖方 16.15 万 m³，填方 29.09 万 m³，无弃方，借方 12.94 万 m³；

建设工期：本项目于 2021 年 3 月开工，2023 年 3 月项目完工，总工期 25 个月；

工程总投资：总投资 3.88 亿元，其中土建投资 1.16 亿元。

3、项目组成及布置

本项目由主体工程区、场外临建工程区共 2 个部分组成。

项目组成表

组成	内容
主体工程区	主要包括29栋住宅楼，6栋商业楼，1栋9班幼儿园，2座配电所、小区对外出入口以及红线外雨污水管网，占地面积10.86hm ² 。
场外临建工程区	包括红线外的1处施工场地以及红线外2处施工便道以及南侧施工扰动，占地面积0.82hm ² 。

(1) 主体工程区

主体工程主要包括红线内的建构筑物、道路广场、景观绿化等设施及项目区的出入口与红线外雨污水管网占地，总占地 10.86hm²，占地类型为林地、水域及水利设施用地、住宅用地、耕地，建设性质为新建。

1) 建构筑物

本项目共建设 29 栋住宅楼，6 栋商业楼，1 栋 9 班幼儿园，2 座配电所，配套建设管理用房等基础设施，建构筑物基底占地 2.49hm²。

2) 道路

内部道路及广场：项目区内道路系统架构清晰，分级明确，人行与机动车适度分流，同时满足消防、救护等要求。本项目用地内车行道路宽 6m，人行道路宽 4m，道路总长约 3553m，占地 2.44hm²；地上停车场共 365 个，占地 0.46hm²；广场硬化区域占地 1.94hm²。本项目内部道路、广场等硬化区域共占地 4.84hm²。

对外连接道路：本项目共有 4 个进出入口，总占地 0.03hm²。连接道路 0.03hm²占地纳入主体工程区与场地内部道路一并考虑。





图 1.2 道路示意图

3) 幼儿园

本项目在占地红线内西南侧建设 1 栋 9 班幼儿园，主要建设教学楼、活动场地、广场及绿化，占地 0.46hm^2 ，其中建构筑物基底面积 0.10hm^2 ，活动场地及广场占地面积 0.26hm^2 ，绿化面积 0.10hm^2 。



幼儿园（2023 年 7 月）



幼儿园（2023 年 7 月）

4) 景观绿化


项目区在建构筑物周边、道路两侧以及围墙退让红线等未硬化区域进行景观绿化，绿化率 32.10%，绿化面积 3.46hm^2 （其中乔木 2104 株，灌木 1690 株，地被 1.38hm^2 ，百慕大混播黑麦草 2.81hm^2 ）。



绿化（2023 年 9 月）



绿化（2023 年 9 月）

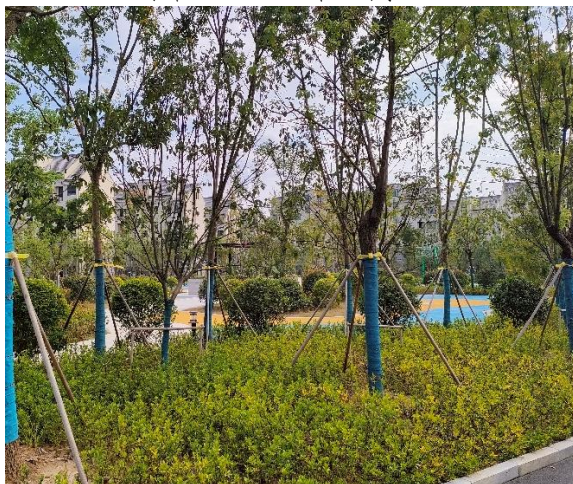

绿化（2023 年 9 月）



绿化（2023 年 9 月）

5) 围墙退让红线情况

项目西侧围墙退让红线 1.5m，幼儿园区域围墙退让红线 6m；南侧与东侧围墙线与红线重合，无退让；北侧为商业区，不设围墙。围墙退让红线面积 0.05hm^2 ，退让部分由建设单位建设停车场、绿化，其中绿化面积 0.02hm^2 （绿化面积纳入主体工程绿化面积内）。

(2) 场外临建工程区

1) 施工场地

本工程在红线外布设了 1 处施工场地，主要为施工生活区、施工项目部，占地


0.46hm²，现已拆除并复耕。



施工场地现状（2023 年 7 月）

2) 施工道路

本工程共布设了 3 条施工便道。1#施工便道位于项目区红线外南侧，连接项目区与南侧道路，道路长 72m，宽 14m，占地 0.10hm²，现已撒播草籽进行恢复；2#施工便道位于项目区红线外西侧，连接项目区与场外临建工程区，2#施工便道宽 6m，长 12m，占地 0.01hm²，现已复耕；3#施工便道位于红线外西侧，连接红线外施工生产生活区与南侧道路，道路长 41m，宽 7m，占地 0.03 hm²，现已复耕。施工便道总占地 0.14hm²。

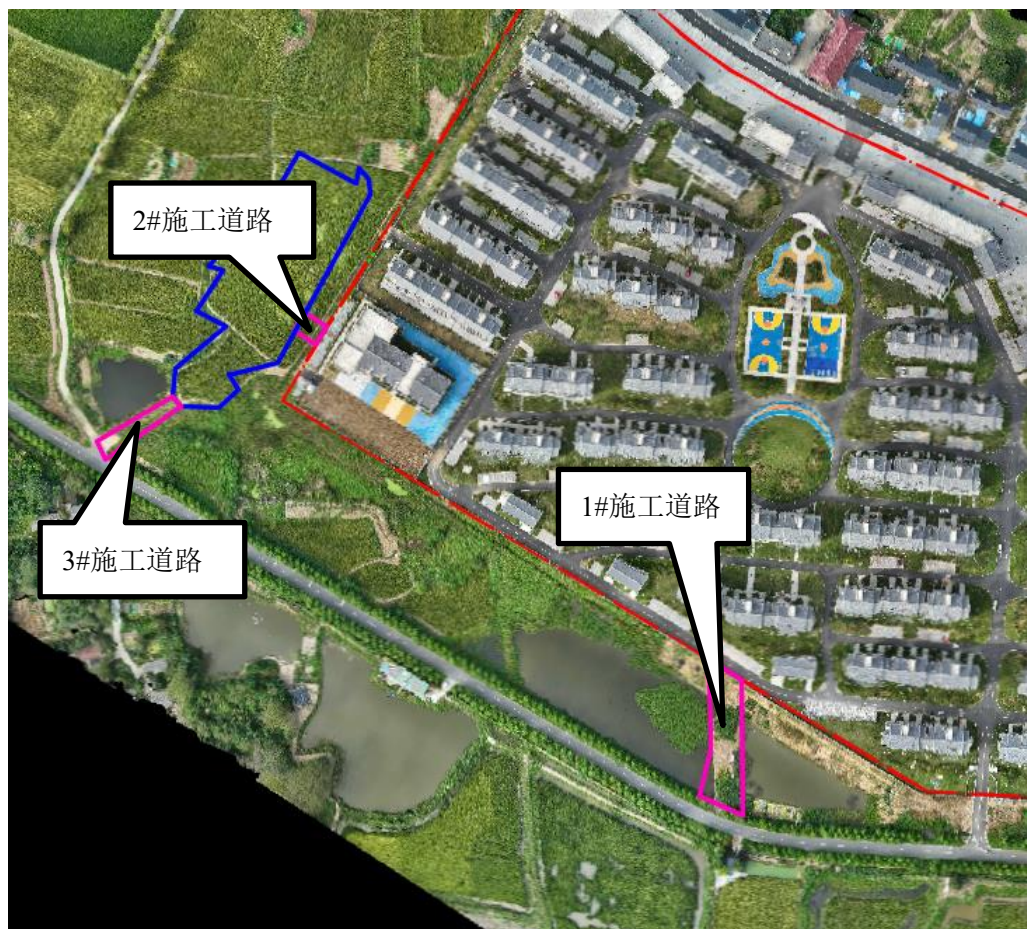

施工道路现状（2023 年 7 月）

3) 临时堆土区

本项目在红线内南侧布设了 1 处临时堆土场，占地 0.15hm^2 。临时堆土场用于堆放项目建构筑物基础开挖土方，最大堆高 2.0m ，最大容量 0.28 万 m^3 。目前土方已回填完成，并建设成幼儿园。

4) 施工扰动

项目建设时，对红线外南侧区域进行扰动，扰动面积 0.24hm^2 ，其中 0.02hm^2 与 1#施工便道重叠，不做重复计算，施工扰动实际红线外占地 0.22hm^2 ，现已撒播草籽进行恢复。



施工扰动现状（2023 年 7 月）

1.1.2 项目区概况

项目位于合肥市肥西县柿树岗乡，属于江淮丘陵区，占地类型为林地、水域及水利设施用地、住宅用地、耕地，场地地形北高南低，原始地面高程为 13.01m~18.06m，地形起伏较大。

项目区原始地形地貌图见图1.3。



图 1.3 项目区原始地形地貌图

项目所在区域属于北亚热带湿润季风气候区，多年平均气温 15.7°C ，极端最高气温 41.0°C ，极端最低气温 -20.6°C 。雨季为 5~8 月，多年平均降水量 983mm，10 年一遇最大 24h 降水量为 142mm，多年平均蒸发量 752.23mm，平均日照时数 2015h 主导风向北风(N)，历年平均风速 2.8m/s，最大风速 20m/s，最大冻土深度 10cm，无霜期 240d。项目区气候气象特征见表 1.1。

表 1.1 项目区主要气象特征值一览表

项目	内容	单位	数值
气候分区	北亚热带湿润季风气候		
气温	多年平均	$^{\circ}\text{C}$	15.7
降水	多年平均	mm	983
	最大 24h 10 年一遇	mm	142
蒸发量	年平均	mm	752.23
风速	年均	m/s	2.8
	最大	m/s	20
	主导风向	N	
冻土深度	最大	cm	10
无霜期	全年	d	240

项目区地带土壤主要为黄棕壤，主要植被类型为北亚热带常绿阔叶林带，项目区林草覆盖率为 32.4%。

项目位于肥西县柿树岗乡，属长江流域。项目区雨水经雨水口汇入地下雨水管道排入市政雨水管网，流入丰乐河，汇入巢湖。

丰乐河：与项目直线距离约 1.55km，丰乐河为长江水系巢湖的支流。发源于龙河口水库，下至巢湖入口，是巢湖的主要支流之一；流域集水面积 2124 平方千米。

巢湖：项目距巢湖 41km，巢湖位于安徽省中部，东西长 55 km、南北宽 21 km，湖岸线周长 176km，平均水深 2.89m，面积 780 km²，容积 20.7 亿立方米，流域面积为 13486 km²。湖水主要靠地面径流补给，是长江中下游的中国五大淡水湖之一。沿湖河流从南、西、北三面汇入湖内，然后在巢湖市城关出湖，经裕溪河东南流至裕溪口注入长江。

项目与主要河流、湖泊的位置关系见图 1.4。



图 1.4 项目区与主要河流、湖泊位置关系图

根据国务院批复的《全国水土保持规划(2015~2030 年)》(国函〔2015〕160 号)、《安徽省水土保持规划(2016~2030 年)》(皖政秘〔2016〕250 号)、《安徽省人民政府(办公厅)关于发布安徽省人民政府关于划定省级水土流失重点预防区和重点治理区的通告》(皖政秘〔2017〕94 号)以及《合肥市水土保持规划(2016~2030 年)》，项目不在水土流失重点防治区内。

根据《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T50433-2018)规定，本项目水土流失防治标准等级执行南方红壤区二级标准。根据《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-

2007),项目区属于南方红壤区,土壤侵蚀类型以微度水力侵蚀为主,侵蚀方式主要为面蚀,容许土壤流失量为 $500\text{t}/(\text{km}^2\cdot\text{a})$ 。

1.2 水土保持工作概况

肥西县柿树岗乡人民政府在本工程建设过程中将水土保持管理工作纳入主体工程的管理范畴,施工单位实施,监理单位把控质量,结合项目实际建设情况,对水土保持措施根据项目实际情况进行了合理优化布置,有效的控制了施工期间的水土流失。

本项目于2021年3月开工,2023年3月完工。水土保持措施与主体工程同步实施。

2021年8月,肥西县水务局下发了《关于对水土保持疑似违规行为进行整改的通知》。

2021年10月,肥西县柿树岗乡人民政府委托安徽鑫成水利规划设计有限公司编制该项目水土保持方案报告书,于2021年11月编制完成了《新建柿树岗乡新街社区整村推进项目(新街安置点)水土保持方案报告书》(送审稿)。

2021年12月12日,肥西县水务局在肥西县组织召开了《新建柿树岗乡新街社区整村推进项目(新街安置点)水土保持方案报告书(送审稿)》技术审查会。

2021年12月31日,肥西县水务局以“肥水审批函〔2021〕104号”印发了《关于新建柿树岗乡新街社区整村推进项目(新街安置点)水土保持方案报告书的批复》。

2021年12月,肥西县柿树岗乡人民政府委托我单位承担本项目的水土保持监测工作。

本工程在施工及试运行期间未发生水土流失危害事件。

1.3 监测工作实施情况

1.3.1 监测实施方案执行情况

肥西县柿树岗乡人民政府于2021年12月委托我单位开展本项目水土保持监测工作,签订水土保持监测工作技术服务合同,确定了双方职责,明确了监测任务、监测时段及监测费用。签订技术服务合同后,我单位及时成立了监测组,组织监测技术人员进入现场,进行踏勘工作。



我单位入场时，项目土方工程已全部完工，正在进行建构筑物上部结构建设。主要采取了遥感解译、对比分析、实地量测等监测方法。通过资料分析、遥感解译、实地量测法进行补充调查，调查前期施工过程中的扰动地表面积、挖填土石方量、损坏水土保持措施面积、已造成的水土流失量，水土流失防治效果。对已实施的水土保持措施的防治效果进行现场监测。

1.3.2 监测项目部设置

由于本工程水土保持监测滞后于工程建设，为顺利开展水土保持监测工作，2021年12月，我单位组建监测项目小组及时进场监测，并与建设单位、施工单位、监理单位进行水土保持工作及水土保持监测技术交底。

本项目水土保持监测工作共有专业技术人员6人，项目监测日常工作人员安排由项目负责人统一调度。项目负责人定期检查协调，解决存在的问题，按时保质完成监测工作。

本项目的人员情况见表1.2。

表 1.2 监测人员情况表

姓名	职称	专业/职务	分工
胡 瑾	高 工	水利工程管理	批准
廖传准	高 工	水利水电工程	审查
余 浩	工程师	水务工程	校核
连明菊	工程师	项目负责人	日常监测
葛晓鸣	工程师	计算机科学与技术	日常监测
宋宇驰	工程师	农业水利工程	日常监测

1.3.3 监测点布设

根据水土保持方案报告书监测点布设要求，结合工程实际建设情况，共布置了4个监测点，分别为主体工程区3处、场外临建工程区1处。监测点位布设见表1.3，监测点位置示意图见附图1.5。



表 1.3 监测点位布设表

序号	区域	位置	坐标 (E/S)		方法	内容
1	主体工程区	绿化区域	116°55'39.08"	31°33'10.94"	遥感法、调查法、实地量测法	场地扰动形式与面积，水土流失量，植被生长情况，水土保持工程措施、植物措施实施效果。
2		排水口 雨水井	116°55'44.34"	31°33'11.62"	遥感法、调查法、实地量测法	
3		堆土区区域	116°55'33.84"	31°33'08.35"	遥感法、调查法、实地量测法	
4	场外临建工程区	扰动区域	116°55'30.41"	31°33'09.98"	遥感法、调查法	



图 1.5 监测点位布设图

1.3.4 监测设施设备

监测设备主要包括测距仪、GPS 定位仪、标杆、照相机等。各种监测方法需要的主要监测设施设备详见表 1.4。

表 1.4 监测设施设备表

序号	设施和设备	型号	单位	数量	备注
一	设施及设备费用				
1	摄像机		台	1	用于收集施工现场影像资料
2	手持式 GPS	GPSIV 型	台	1	用于监测点、场地及现象点的定位和量测, 1 部
3	数码照相机		台	1	用于监测现象的图片记录, 1 台
4	计算机		台	1	用于文字,图表处理和计算, 1 台
5	皮尺、卷尺、卡尺等		套	1	用于观测侵蚀量及沉降变化,植被生长情况及其它测量, 1 套
二	消耗性设施及其它				
1	地形图			1	熟悉当地地形条件, 了解项目总体布局情况
2	汽油		kg	500	用于车辆消耗
3	辅材及配套设备				用于各种设备安装补助材料、小五金构件及易损配件补充, 若干。
4	卫片			8	用于遥感监测

1.3.5 监测技术方法

根据工程建设的特性、水土流失及其防治的特点, 该工程采用实地量测、遥感监测和资料分析三种方法进行水土保持监测。监测过程中, 综合运用各种监测方法, 点多多方法或一点多方法, 以确保监测数据的准确性。

(1) 实地量测

对于扰动土地面积、边坡坡度、高度等因子; 水土保持林草措施的成活率、保存率、生长发育情况(林木的树高、胸径、冠幅等)及其植被覆盖度的变化等采用实地量测的方法。具体方法为:

①临时堆土监测过程中采用移动数据采集终端、Contour XL Ric 激光测距仪等先进仪器进行测量, 解决了有些监测点的监测指标无法采集的问题, 确保了数据的完整性。

②灌木盖度(含零星乔木)的监测采用线段法。用测绳或皮尺在所选定样方灌木上方水平拉过, 垂直观察灌丛在测绳上的投影长度, 并用卷尺测量。灌木总投影长度与测绳或样方总长度之比, 即为灌木盖度。用此法在样方不同位置取三条线段求取平均值, 即为样方灌木盖度。

③草地盖度的监测采用针刺法。用所选定样方内, 选取2m×2m 的小样方, 测绳每20cm 处用细针($\phi=2\text{mm}$)做标记, 顺次在小样方内的上、下、左、右间隔

20cm 的点上，从草的上方垂直插下，针与草相接触即算有，不接触则算无。针与草相接触点数占总点数的比值，即为草地盖度。用此法在样方内不同位置取三个小样方求取平均值，即为样方草地的盖度。

④侵蚀沟样方测量法。根据侵蚀沟的形状尺寸计算水土流失体积，利用土壤容重换算土壤流失量。采用随机抽样的方式，选择有代表性的侵蚀沟，在每条侵蚀沟的上、中、下3 段选择若干个典型断面，对每个断面的侵蚀宽度、深度进行测量，并以梯形或三角形断面形式计算断面面积，求出断面面积平均值，再乘以沟长和土壤容重既得单条沟的侵蚀量。

（2）遥感监测

基于高分辨率遥感影像，通过现场勾绘和人机交互解译，对区内建设活动的扰动范围、强度、土石方量、水土流失程度及区域生态环境影响等进行宏观监测。同时，在现场监测过程中，对于各监测点扰动地表情况、水土流失状况、水土保持措施实施情况采用无人机航拍，获取图像数据。

（3）资料分析

对于扰动土地原地貌类型、扰动面积、取弃土（渣）量等采用资料分析的方法进行监测。通过向工程建设单位、设计单位、监理单位收集有关工程资料，主要是项目区土地利用现状及用地批复文件资料；主体工程有关设计图纸、资料；项目区的土壤、植被、气象、水文、泥沙资料；监理、监督单位的月报及有关汇总报表等，从中分析出对水土保持监测有用的数据。

由于项目已于2021年3月开工，水土保持监测工作时间较滞后，对于项目区原地貌情况及土建施工阶段工程建设、扰动及水土流失情况主要采取遥感调查及同期同类生产建设项目进行推算。

1.3.6 监测成果提交情况

2021年12月接受建设单位委托后，监测组及时开展现场监测，并根据实际测量和资料查询的情况，进行补充调查，形成现场监测记录资料以及现场影像资料，补充编制完成了2021年3月~2023年12月共12期监测季报。

监测工作结束后，经过资料整理和分析，监测人员在2023年11月，编制完成《新建柿树岗乡新街社区整村推进项目（新街安置点）水土保持监测总结报告》。

2 监测内容与方法

2.1 扰动土地情况

本项目扰动土地情况监测主要采用实地量测、遥感监测、资料分析的监测方法。监测内容主要包括各防治分区扰动范围、面积及土地利用类型变化情况等。

本项目扰动土地情况监测内容、方法及频次见表 2.1。

表 2.1 扰动土地情况的监测内容、方法及频次

防治分区	监测内容		监测方法	监测频次
	范围	扰动形式及面积		
主体工程区	红线内区域	扰动面积及其变化情况	遥感监测、 资料分析	遥感监测：施工前一次，施工中一次，施工后一次；资料分析：每季度一次。
场外临建工程区	红线外扰动区域	扰动面积及其变化情况		

2.2 水土保持措施

本项目水土保持措施的实施效果监测主要采用实地量测、遥感监测、资料分析的监测方法。对于工程防治措施，主要调查其实施数量、质量及进度；防护工程稳定性、完好程度、运行情况、措施的拦渣保土效果。植物措施主要调查其不同阶段林草种植面积、成活率、生长情况及覆盖度；扰动地表林草自然恢复情况；植物措施拦渣保土效果。对于临时防护措施，主要调查其实施情况，如实施数量、质量、进度、运行情况和临时措施的拦渣保土效果。

水土保持措施实施效果监测内容、方法及频次见表 2.2。

表 2.2 水土保持措施实施效果监测内容、方法及频次

防治分区	监测内容			监测方法	监测频次
	工程措施	植物措施	临时措施		
主体工程区	雨水管道、土地整治、植草砖等工程施工进度、数量、质量、稳定性、完好程度、运行情况等	乔灌木植被建设实施进度、数量、成活率、保存率等	临时排水、苫盖等措施施工进度、数量、效果等	实地量测、遥感监测、资料分析	实地量测：共一次；遥感监测：施工前一次，施工中一次，施工后一次；资料分析：每季度一次。
场外临建工程区	土地整治等工程施工进度、数量、质量、稳定性、完好程度、运行情况等	/	、临时绿化措施施工进度、数量、效果等		

2.3 水土流失情况

本项目是水土流失情况监测主要采用遥感监测、资料分析的监测方法。水土流失面积监测采用实地量测、遥感监测相结合的方法；土壤流失量监测采用侵蚀沟样方测量的方法。水土流失危害采用资料分析和现场量测的方法进行监测。

水土流失情况监测内容、方法及频次见表2.3。

表 2.3 水土流失情况监测内容、方法及频次

防治分区	监测内容			监测方法	监测频次
	土壤流失面积	土壤流失量	水土流失危害		
主体工程区	建构筑物开挖、回填等裸露地表、临时堆土	建构筑物开挖回填、裸露地表、临时堆土水土流失量及不同时段变化情况	造成水土流失事件的成因、损失、潜在危害和补救措施	遥感监测、资料分析	遥感监测：施工前一次，施工中一次，施工后一次；资料分析：每季度一次。
场外临建工程区	裸露地表	裸露地表水土流失量及不同时段变化情况			



3 重点部位水土流失动态监测结果

3.1 防治责任范围监测

3.1.1 水土流失防治责任范围

1) 水土保持方案确定的防治责任范围

根据肥西县水务局印发的《关于新建柿树岗乡新街社区整村推进项目（新街安置点）水土保持方案报告书的批复》（肥水审批函〔2021〕104号），该项目水土流失防治责任范围为 11.46hm²。详见表 3.1。

表 3.1 水土保持方案确定水土流失防治责任范围 单位：hm²

项目区	项目建设区			防治责任范围
	永久占地	临时占地	小计	
主体工程区	10.82	0.04	10.86	10.86
场外临建工程区		0.60	0.60	0.60
合计	10.82	0.64	11.46	11.46
防治责任主体	肥西县柿树岗乡人民政府			

2) 建设期防治责任范围监测成果

根据实地调查和定位监测结果，对主体工程征占地资料、竣工资料查阅复核，本项目水土流失防治责任范围为 11.68hm²，其中主体工程区 10.86hm²，场外临建工程区 0.82hm²，建设期实际发生的防治责任范围详见表 3.2。

表 3.2 建设期实际发生的水土流失防治责任范围表 单位：hm²

项目区	项目建设区			防治责任范围
	永久占地	临时占地	小计	
主体工程区	10.82	0.04	10.86	10.86
场外临建工程区		0.82	0.82	0.82
合计	10.82	0.86	11.68	11.68
防治责任主体	肥西县柿树岗乡人民政府			

3) 对比分析

本项目建设期实际防治责任范围 11.68hm²，较批复方案的防治责任范围增加了 0.22hm²，主要是场外临建工程区增加了 0.22hm²。建设期水土流失防治责任范围与方案对比表详见表 3.3。

表 3.3 建设期水土流失防治责任范围与方案对比

项目分区	防治责任范围 (hm ²)		
	方案设计	实际	较方案增加或减少
主体工程区	10.86	10.86	0
场外临建工程区	0.60	0.82	+0.22
合计	11.46	11.68	+0.22

监测数据和方案设计变化的主要原因：

根据现场实地调查、资料分析以及建设单位的沟通，项目进行土方回填时，对围墙外南侧区域进行扰动，导致防治责任范围增加。

3.1.2 背景值监测

根据《安徽省水土保持公报（2022 年）》，结合批复的《新建柿树岗乡新街社区整村推进项目（新街安置点）水土保持方案》（报批稿），调查施工监理前期的资料，确定本项目各防治区原始地貌土壤侵蚀模数，具体如下：

项目区范围内占地类型为耕地、住宅用地，土壤侵蚀模数强度属微度，土壤侵蚀模数背景值为 380t/(km²·a)。

3.1.3 建设期扰动土地面积

通过查阅技术资料和设计图纸，结合实地监测，分别对各区域的项目建设区扰动地表、占压土地和损坏林草植被的面积进行测算。本工程造成扰动和损坏的面积总计为 11.68hm²。各分区扰动土地情况对比表详见表 3.4。



表 3.4 扰动土地情况对比表 单位: hm^2

分区	方案阶段	实际扰动	变化情况	变化原因
主体工程区	10.86	10.86	0	
场外临建工程区	0.60	0.82	+0.22	项目进行土方回填时,对围墙外南侧的区域进行扰动
合计	11.46	11.68	+0.22	项目进行土方回填时,对围墙外南侧的区域进行扰动

3.2 取土(石、料)监测结果

通过调查监测和实地监测,本工程借方 12.94 万 m^3 来自新建柿树岗乡联圩村整村推进项目(联圩安置点),无取土场。

3.3 弃渣监测结果

通过调查监测和实地监测,本工程无余方,无弃土场。

3.4 表土监测结果

本项目开工前未对表土进行单独剥离,表土与一般土石方一起用于项目回填。

3.5 土石方流向情况监测结果

通过查阅工程计量、施工监理资料结合实地调查,本项目总挖方 16.18 万 m^3 ,填方 29.12 万 m^3 ,无弃方,借方 12.94 万 m^3 。

工程总挖方 16.18 万 m^3 ,其中基坑开挖土方 13.24 万 m^3 ,雨水、污水管网等挖方 1.83 万 m^3 ,场地平整开挖土方 1.11 万 m^3 ;填方 29.12 万 m^3 ,其中建构筑物基础回填 1.08 万 m^3 ,管道回填 0.61 万 m^3 ,场地垫高回填 27.43 万 m^3 ;无弃方,借方 12.94 万 m^3 ,来自新建柿树岗乡联圩村整村推进项目(联圩安置点)。

土石方平衡流向见表 3.5,方案设计和监测土石方平衡及流向对比见表 3.6。

表3.5 土石方平衡及流向表 单位: 万m³

建设内容		挖方				填方	调入		调出		借方		余方	
		清基 清表	硬化 拆除	一般 土石方	池塘 清淤		数量	来源	数量	去向	数量	来源	数量	去向
主体工程区	①场地平整		0.12	0.30	0.62	27.18	13.44	②⑤④			12.7	新建柿树岗乡联圩村整村推进项目（联圩安置点）		
	②建构物基础开挖			13.24		1.08			12.16	①				
	③管线工程			1.83		0.61			1.22					
场外临建工程区	④场地平整			0.01		0.25					0.24	新建柿树岗乡联圩村整村推进项目（联圩安置点）		
	⑤临建工程		0.06						0.06	①				
总计		16.18				29.12					12.94	新建柿树岗乡联圩村整村推进项目（联圩安置点）		

表 3.6 方案设计和监测土石方平衡及流向对比表 单位: 万 m³

项目组成	方案设计				监测结果				增减情况			
	开挖	回填	借方	弃方	开挖	回填	借方	弃方	开挖	回填	借方	弃方
主体工程区	14.86	27.62	12.70	0	16.11	28.87	12.70	0	+1.25	+1.25	0	0
场外临建工程区	0.07	0.25	0.24	0	0.07	0.25	0.25	0	0	0	0	0
合计	14.93	27.87	12.94	0	16.18	29.12	12.94	0	+1.25	+1.25	0	0

变化原因:

1、根据现场调查及施工监理等资料,主体工程区管线挖方量增加以及 1#商业楼区域拆迁量增加,导致挖方总量增加。

2、管线开挖多余土方用于场地垫高,导致填方量增加。

3.6 其他重点部位监测结果

3.6.1 水土流失影响监测

根据实地调查,工程在建设过程中,由于场地平整、建构筑物基坑开挖、道路修建、管沟施工等活动,使地表植被遭到破坏,土体结构松散,在外营力的作用下,造成水土流失。

3.6.2 水土流失灾害事件监测

根据调查,工程建设期间未发生水土流失事件。

4 水土流失防治措施监测结果

4.1 工程措施监测结果

4.1.1 工程措施设计情况

根据批复的水土保持方案，工程措施如下：

1) 主体工程区：雨水管道 6104m，雨水井 306 座，土地整治 3.46hm²，植草砖 0.57hm²，雨水调蓄池 1 座。

2) 场外临建工程区：土地整治 0.60hm²。

4.1.2 工程措施实施工程量及实施进度监测

项目的水土保持工程措施实施时间为 2022 年 8 月至 2023 年 1 月，水土保持措施基本同步实施。

1) 主体工程区：雨水管道 6104m，雨水井 306 座，土地整治 3.46hm²，植草砖 0.46 hm²，雨水调蓄池 1 座。

2) 场外临建工程区：土地整治 0.82hm²。

本项目实际完成的水土保持工程措施工程量详见表 4.1。

表 4.1 水土保持工程措施完成情况表

防治分区	防治措施	单位	工程量	实施时间	位置
主体工程区	土地整治	hm ²	3.46	2022.8~2023.1	植被建设区域
	雨水管道	m	6104	2022.8~2022.11	沿建构筑物、道路布设
	雨水井	个	306	2022.8~2022.11	沿建构筑物、道路布设
	雨水调蓄池	座	1	2022.10	沿建构筑物、道路布设
	植草砖	hm ²	0.46	2022.10~2023.1	地面停车场
场外临建工程区	土地整治	hm ²	0.82	2022.8、2023.3	场外扰动区域

4.1.3 工程措施工程量对比分析

表 4.2 项目实际完成工程措施工程量与方案对比表

防治分区	防治措施	单位	方案 工程量	实际 完成量	增减 工程量	变化原因
主体工程区	土地整治	hm ²	3.46	3.46	0	严格按照图纸施工，实际完成较方案阶段无变化
	雨水管道	m	6104	6104	0	
	雨水井	个	306	306	0	
	雨水调蓄池	座	1	1	0	
	植草砖	hm ²	0.57	0.46	-0.11	商业区域停车场调整为硬化停车场，未铺设植草砖，导致植草砖面积减少
场外临建工程区	土地整治	hm ²	0.60	0.82	+0.22	项目建设时对南侧新增南侧围墙外区域扰动，导致土地整治面积增加

4.2 植物措施监测结果

4.2.1 植物措施设计情况

根据批复的水土保持方案，植物措施设计如下：

主体工程区：植被建设 3.46hm²（其中乔木 881 株，灌木 530 株，百慕大草坪 3.12hm²）。

4.2.2 植物措施实施工程量及实施进度监测

项目的水土保持植物措施实施时间为 2023 年 1 月至 2023 年 3 月。

主体工程区：植被建设 3.46hm²（其中乔木 2104 株，灌木 1690 株，地被 1.38hm²，百慕大混播黑麦草 2.81hm²）。

本工程实际完成的水土保持植物措施工程量见表 4.3。

表 4.3 植物措施工程量完成情况表

防治分区	措施类型		单位	工程量	实施时间	位置
主体工程区	植被建设面积		hm ²	3.46	2023.1-2023.3	建构筑物、道路 周边空闲区域
	其中	乔木	株	2104		
		灌木	株	1690		
		地被植物	hm ²	1.38		
		百慕大混播黑 麦草	hm ²	2.81		

4.2.3 植物措施工程量对比分析

表 4.4 项目实际完成植物措施与方案设计工程量对比表

防治分区	防治措施		单位	方案 工程量	实际 完成量	增减 工程量	变化原因
主体工程区	植被建设面积		hm ²	3.46	3.46	0	设计调整，增加了乔 灌木数量
	其中	乔木	株	881	2104	+1223	
		灌木	株	530	1690	+1160	
		地被植物	hm ²	0	1.38	+1.38	
		百慕大混播黑麦草	hm ²	3.12	2.81	-0.31	

表 4.5 苗木表

序号	苗木名称	数量	单位	规格(CM)				备注
				胸径	冠幅	高度	分枝点	
1	香樟 F	104	株	16	400-450	600-700	200-220	主干通直，全冠，一级主枝 4-5，保留 3 级主枝
2	朴树 F	240	株	15-16	400-450	650-700	220-250	主干通直，全冠，一级主枝 4-5，保留 3 级主枝
3	朴树 H	20	株	18	400-450	600-700	200-250	主干通直，全冠，一级主枝 4-5，保留 3 级主枝
4	丛生乌桕 E	60	株	--	500-550	700-800	--	4-5 杆，12-13CM/杆，全冠
5	合欢 D	30	株	18-20	450-500	650-700	200-220	主干通直，全冠，一级主枝 2-3，保留 3 级主枝
6	栎树 D	80	株	18	400-450	700-750	220-250	主干通直，全冠，一级主枝 4-5，保留 3 级主枝
7	栎树 F	180	株	12	350-400	500-600	180-200	主干通直，全冠，一级主枝 4-5，保留 3 级主枝
8	银杏 D	120	株	18	400-450	800-900	170-180	主干通直，全冠，实生苗
9	榉树 D	160	株	12	300-350	600-700	170-180	主干通直，全冠
小乔木及大灌木								
序号	苗木名称	数量	单位	规格(CM)				备注
				地径	冠幅	高度	分枝点	
1	石楠 E	640	株	-	300	300-350	30-50	主干通直，全冠，修剪后尺寸
2	金桂 G	150	株	-	300	300-350	-	丛生，全冠，修剪后尺寸
3	北美海棠 D	40	株	10	350	350-400	50-60	主干通直，全冠，修剪后尺寸
4	鸡爪槭 F	60	株	9	250	250-300	40-50	全冠，3-4 主分枝，修剪后尺寸
5	日本早樱 E	90	株	9	250-300	350-400	100-120	主干通直，全冠，4-5 分枝，修剪后尺寸
6	花石榴 F	130	株	-	250	250-300	-	全冠，丛生，8-10 主分枝，修剪后尺寸
7	刚竹	450	m²	3-4		300-350		16/m²，2-3 杆
球类								
序号	苗木名称	数量	单位	规格(CM)				备注
				冠幅	高度			

1	栀子花球 A	100	株	200	120-130	全冠, 光球
2	红叶石楠球 C	860	株	200	130-150	全冠, 光球
3	金叶女贞球 C	730	株	150	100-110	全冠, 光球
地被小苗						
序号	苗木名称	数量	单位	规格(CM)		备注
				冠幅	高度	
1	红叶石楠	5321	m ²	40-45	50-55	25/ m ² , 毛球, 修剪徒长枝
2	金森女贞	1010	m ²	30-35	30-35	49 株/ m ² , 毛球, 修剪徒长枝
3	毛鹃	604	m ²	30-35	30-35	49 株/ m ² , 毛球, 修剪徒长枝
4	法青高篱	887	m ²	45-50	150	4 株/ m ² , 4-5 杆分枝, 绿篱状
5	金边黄杨	800	m ²	25-30	35-40	49 株/ m ² , 2-3 杆
6	小叶黄杨	1299	m ²	20-25	30-35	49 株/ m ² , 毛球
7	大叶黄杨	1852	m ²	20-25	35-40	49 株/ m ² , 2-3 杆
8	小叶栀子	1801	m ²	20-25	30-35	49 株/ m ² , 毛球
9	细叶麦冬	265	m ²	15-20	20-25	64 丛/ m ² , 15-20 叶/丛(包含黄金间碧竹 215M2)
10	草坪	28120	m ²			矮生百慕大混播黑麦草

4.2.4 植物措施成活率、生长情况监测

植物措施实施前都进行了土地整治, 苗木规格符合设计要求, 植物措施总体质量合格, 长势良好, 后期需加强植物措施养护管护工作。

4.3 临时防治措施监测结果

4.3.1 临时措施设计情况

根据批复的水土保持方案, 临时措施设计如下:

1) 主体工程区: 土质排水沟 864m, 浆砌砖排水沟 1267m, 临时绿化 0.41hm², 密目网苫盖 20000 m², 撒播狗牙根草籽 0.38hm²;

2) 场外临建工程区: 盖板排水沟 88m, 混凝土排水沟 404m, 临时绿化 0.03hm², 撒播草籽 0.35hm²。

4.3.2 临时措施实施工程量及实施进度监测

根据查阅工程计量, 临时措施施工主要在 2021 年 3 月至 2022 年 12 月, 主要采取的临时措施有:

1) 主体工程区: 土质排水沟 758m, 浆砌砖排水沟 1267m, 临时绿化 0.41hm², 密目网苫盖 26500 m²;

2) 场外临建工程区: 盖板排水沟 88m, 混凝土排水沟 404m, 临时绿化 0.03hm², 撒播草籽 0.32hm²。



本工程水土保持临时措施实施情况见表 4.6。

表 4.6 临时措施工程量完成情况表

防治分区	防治措施	单位	工程量	实施时间	位置
主体工程区	土质排水沟	m	758	2021.3~2021.5	建构筑物周边
	浆砌砖排水沟	m	1267	2021.7~2021.10	建构筑物周边
	临时绿化	hm ²	0.41	2021.4~2022.6	地面空闲区域
	密目网苫盖	m ²	26500	2021.11~2022.12	裸露地表及堆土
场外临建工程区	盖板排水沟	m	88	2021.3	红线外项目部道路一侧
	混凝土排水沟	m	404	2021.3	红线外生活区道路一侧
	临时绿化	hm ²	0.03	2021.3	施工项目部周边
	撒播狗牙根草籽	hm ²	0.32	2022.8、2023.6	1#施工便道及施工扰动

4.3.3 临时措施工程量对比分析

表 4.7 实际完成临时措施工程量与方案对比表

防治分区	防治措施	单位	方案工程量	实际完成量	增减工程量	变化原因
主体工程区	土质排水沟	m	864	758	-106	实际施工时根据场地现状进行调整，排水沟长度减少
	浆砌砖排水沟	m	1267	1267	0	方案编制时，临时措施已实施
	临时绿化	hm ²	0.41	0.41	0	方案编制时，临时措施已实施
	密目网苫盖	m ²	20000	26500	+6500	对裸露边坡进行苫盖，密目网数量增加
	撒播狗牙根草籽	hm ²	0.38	0	-0.38	对裸露边坡采用密目网进行苫盖，未撒播草籽
场外临建工程区	盖板排水沟	m	88	88	0	方案编制时，临时措施已实施
	混凝土排水沟	m	404	404	0	方案编制时，临时措施已实施
	临时绿化	hm ²	0.03	0.03	0	方案编制时，临时措施已实施
	撒播狗牙根草籽	hm ²	0.35	0.32	-0.03	2#及 3#施工场地复耕，未撒播草籽

4.4 水土保持措施防治效果

新建柿树岗乡新街社区整村推进项目（新街安置点）基本实施了主体设计确定的水土保持措施。根据现场调查，对照有关规范和标准，实施措施布局无制约性因素，已实施的水土保持措施防治水土流失的功能未变，能有效防治水土流失，项目区的原有水土流失得到治理，新增水土流失得到有效控制，生态得到最大限度的保护，环境得到明显改善，水土保持设施安全有效。

5 土壤流失情况监测

5.1 水土流失面积

根据项目总体布局，结合前期施工遥感影像和后期实地调查，对项目建设期开挖扰动、占压地表和损坏的植被面积进行量测统计，施工期最大水土流失面积 11.68hm²，试运行期水土流失面积 4.28hm²。

各阶段水土流失面积详见表 5.1。

表 5.1 各阶段水土流失面积

监测单元	面积 (hm ²)	
	施工期	试运行期
主体工程区	10.86	3.46
场外临建工程区	0.82	0.82
合计	11.68	4.28

5.2 土壤流失量

5.2.1 水土流失影响因子监测结果

(1) 降雨量变化情况

本项目位于肥西县柿树岗乡内。工程建设期 2021 年 3 月至 2023 年 12 月降水量采用柿树岗乡的观测资料，项目区的降雨资料见表 5.2 所示。

表 5.2 项目区降雨量情况表

年份	年降雨量(mm)	1~3 月降雨量	4~6 月降雨量	7~9 月降雨量	10~12 月降雨量
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
2021 年	964	178	284	374	128
2022 年	698.5	315	118	125	140.5
2023 年	902.5	53	404.5	339.5	105.5

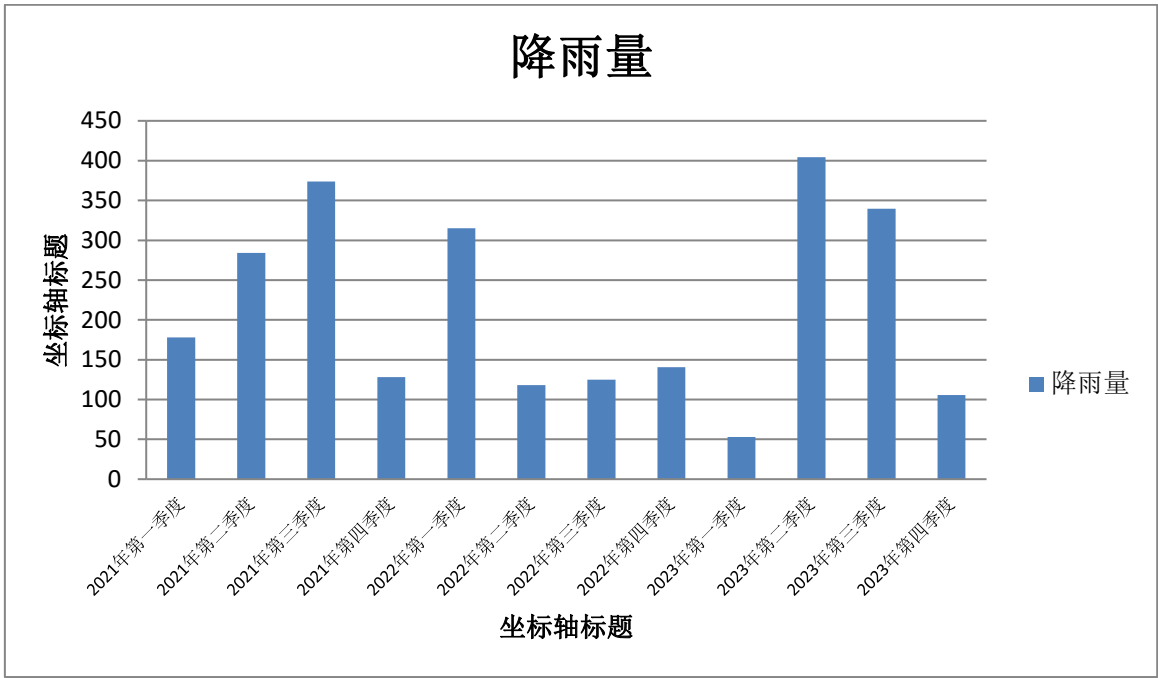


图 5.1 项目降雨量柱状图

从表 5.2 及图 5.2 中可以看出，建设期降雨量年内分布不均，年降雨量主要集中在第二、三季度，是产生水土流失的主要时段。

(2) 施工活动的变化

项目随着施工活动造成扰动面的增加，水土流失量逐步增加，随着建构筑物、地面硬化及水土保持措施的实施，水土流失量逐步减少。建构筑物基础开挖、临时堆土等土方工程集中在 2021 年~2022 年，水土流失主要集中在 2021 年~2022 年。

5.2.2 土壤侵蚀模数背景值调查监测

根据《土壤侵蚀分类分级标准》，结合本项目的报批稿（新建柿树岗乡新街社区整村推进项目（新街安置点）水土保持方案报告书）和影像资料，采取实地监测，项目区分区土壤侵蚀模数背景值取值结果见表 5.3。

表 5.3 土壤侵蚀模数背景值表

项目分区	主体工程区	场外临建工程区	合计
分区面积 (hm ²)	10.86	0.82	11.68
土壤侵蚀模数 (t/(km ² ·a))	380	380	380

5.2.3 施工期土壤侵蚀监测


水土流失主要发生在施工期（含施工准备期），工程于 2021 年 3 月开工 2023 年 3 月完工。

监测进场前，水土流失量监测主要采用调查法，结合遥感影像，确定这一时段的侵蚀强度。

监测进场以后，水土流失量监测主要采用实地量测法，施工期刚开始阶段，建筑物基础开挖及回填、内部道路修建、临时堆土堆放，扰动面积较大，因降雨和人为扰动，平均土壤侵蚀模数加大。随着施工进度的进行，各区域的硬化、工程措施和植物措施的实施，各区域水土保持措施的实施及逐渐发挥效益，水土流失量显著降低，平均土壤侵蚀模数降低。根据监测数据，到 2023 年 3 月，整个项目区平均土壤侵蚀模数下降到 350t/(km²·a)。施工期各阶段的侵蚀模数见表 5.4。

表 5.4 各扰动单元侵蚀模数表

分区/ 侵蚀时间	主体工程区 侵蚀模数 (t/(km ² ·a))	场外临建工程区 侵蚀模数(t/(km ² ·a))
2021.01.01	510	480
2021.03.31		
2021.04.01		
2021.06.30	638	550
2021.07.01		
2021.09.30		
2021.10.01	696	590
2021.12.31		
2022.01.01		
2022.03.31	498	420
2022.04.01		
2022.06.30		
2022.07.01	652	570
2022.09.30		
2022.10.12		
2022.12.31	457	401
2023.01-01		
2023.03.31		
2023.04.01	483	426
2023.06.30		
2023.07.01		
2023.09.30	414	360
2023.10.01		
2023.12.31		
2023.01-01	421	370
2023.03.31		
2023.04.01		
2023.06.30	350	350
2023.07.01		
2023.09.30		
2023.10.01	350	350
2023.12.31		

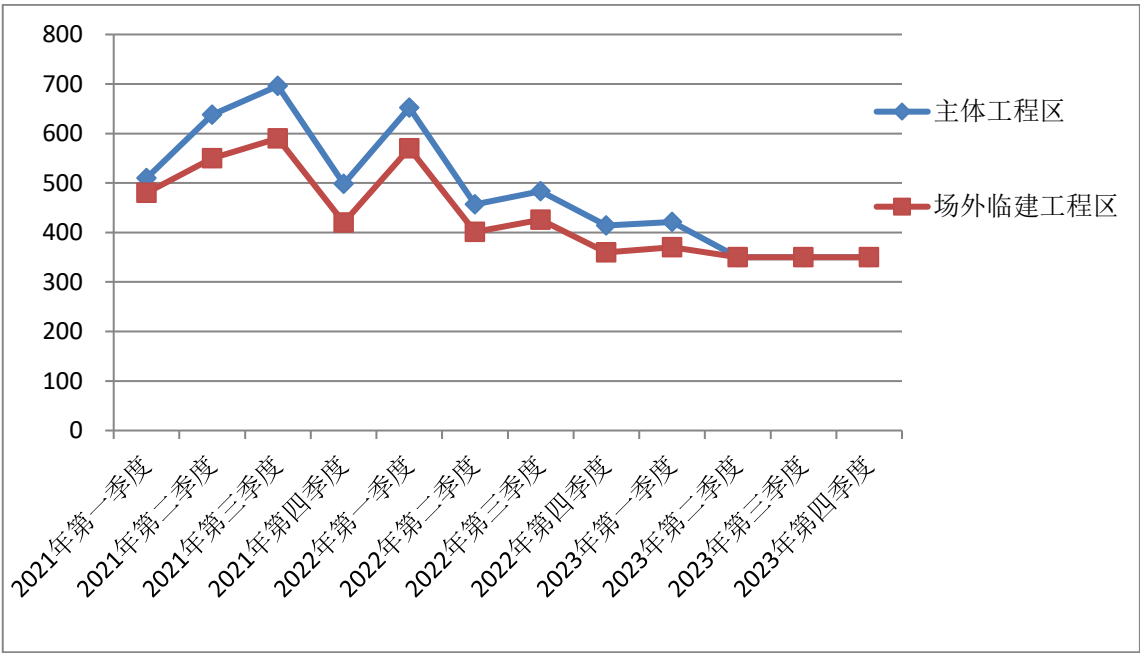

项目区侵蚀强度

5.2.4 施工期水土流失面积监测

本项目通过查阅主体工程施工进度资料、监理资料，施工过程中的视频影像资料，以及实地监测测量获取各阶段的扰动面积，具体如下：

表 5.5 各时段施工期水土流失面积调查表

分区/ 侵蚀时间	主体工程区 侵蚀面积	场外临建工程区 侵蚀面积
2021.01.01	3.65	0.60
2021.03.31		
2021.04.01	10.86	0.11
2021.06.30		
2021.07.01	8.62	0.11
2021.09.30		
2021.10.01	6.45	0.11
2021.12.31		
2022.01.01	5.56	0.11
2022.03.31		
2022.04.01	3.91	0.11
2022.06.30		
2022.07.01	3.67	0.11
2022.09.30		
2022.10.12	3.46	0.11
2022.12.31		
2023.01.01	3.01	0.11
2023.03.31		
2023.04.01	2.45	0.11
2023.06.30		
2023.07.01	0.10	0.01
2023.09.30		
2023.10.01	0.10	0.01
2023.12.31		

5.2.5 建设期土壤侵蚀强度分析计算

1) 施工期

施工期随着工程的逐步开展，扰动面加大，由于场地平整、建构筑物基础开挖及回填等活动，侵蚀强度加大，随着主体的硬化，水土保持措施发挥效益，水土流失得到有效的治理，侵蚀强度、土壤流失量逐步减少，对周边的危害和影响也大为减少。

施工期间，主体工程区的最大土壤侵蚀模数达到 $696t/(km^2 \cdot a)$ ，主要是场内建构筑物基础开挖及填筑，土方较多，道路路面未硬化，排水设施不完善；场外临建工程区最大土壤侵蚀模数达到 $590t/(km^2 \cdot a)$ ，主要是施工过程中地表裸露区域遇到侵蚀降雨，导致水土流失较为明显。总体来看随着工程措施和植物措施的逐步实施，到了工程施工期的末端，从监测数据来看，水土流失得到了有效的控制。

2) 试运行期

随着植物措施和工程措施的逐步实施，各区水土流失得到了有效的控制，土壤侵蚀模数降到了 $350t/(km^2 \cdot a)$ 。



5.2.6 各阶段土壤流失量

1、土壤流失计算方法

通过对定位观测和调查收集到的监测数据按各个防治责任分区进行分类、汇总、整理，利用水土流失面积、侵蚀模数和侵蚀时段计算出各分区水土流失量。

土壤流失计算公式： $M_s = F \times K_s \times T$

式中： M_s ——土壤流失（t）；

F ——土壤流失面积（ km^2 ）；

K_s ——土壤流失模数（ $\text{t}/(\text{km}^2 \cdot \text{a})$ ）；

T ——侵蚀时段（a）。

2、各阶段水土流失量计算

依据上述土壤流失量计算公式，结合各阶段水土流失面积，计算得出施工期（含施工准备期）和试运行期各扰动地表侵蚀单元的土壤侵蚀量，施工期扰动面造成水土流失量监测成果详见表 5.7，与方案阶段预测的各区域的水土流失量对比见表 5.8。

3、土壤流失量

从表 5.7 可以看出，项目建设期内土壤流失总量为 73.9t，主要发生在施工期，随着措施的实施，流失量逐渐减少。

表 5.6 项目建设水土流失量调查统计表

分区/ 侵蚀时间	主体工程区 侵蚀量	场外临建工程区 侵蚀量
2021.01.01	4.7	0.7
2021.03.31		
2021.04.01	17.3	0.2
2021.06.30		
2021.07.01	15.0	0.2
2021.09.30		
2021.10.01	8.0	0.1
2021.12.31		
2022.01.01	9.1	0.1
2022.03.31		
2022.04.01	4.5	0.1
2022.06.30		
2022.07.01	4.4	0.1
2022.09.30		
2022.10.12	3.6	0.1
2022.12.31		
2023.01-01	3.2	0.1
2023.03.31		
2023.04.01	2.1	0.1
2023.06.30		
2023.07.01	0.1	0.0
2023.09.30		
2023.10.01	0.1	0.0

2023.12.31

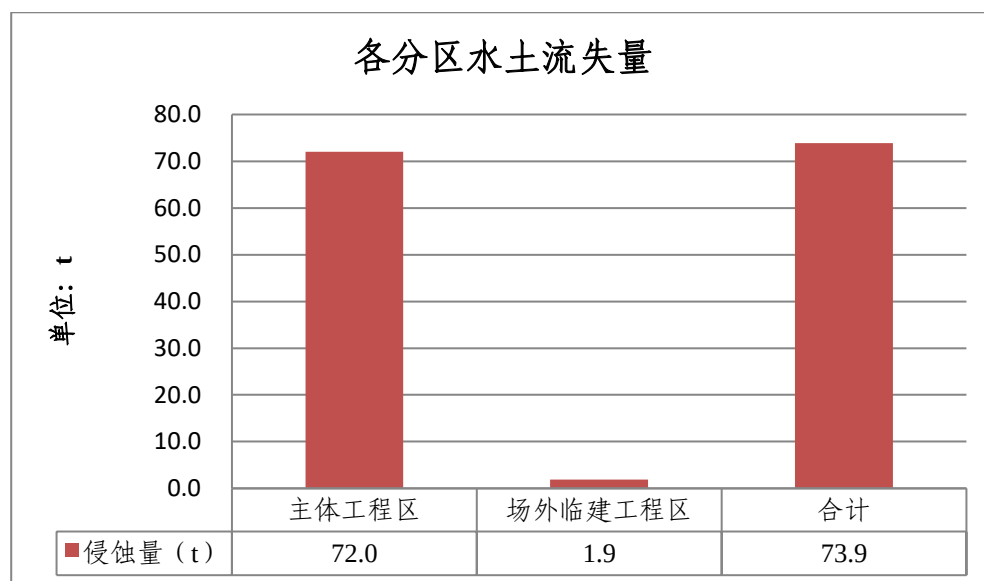


图 5.2 各分区水土流失量图

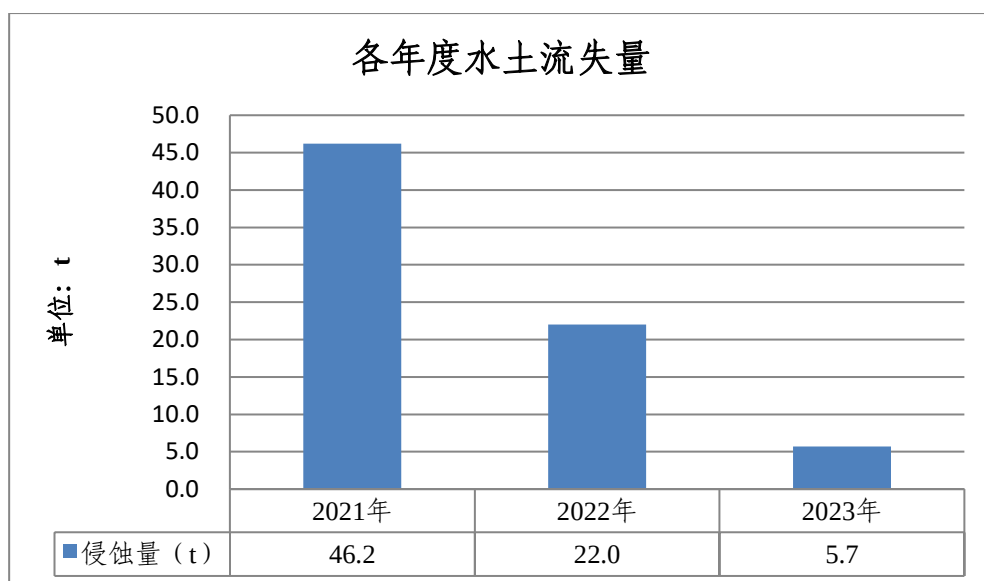


图 5.3 各年度水土流失量图

由表 5.6、图 5.2、图 5.3 可知,施工期间主要的土壤流失发生在 2021~2022 年,这期间主要由于场地的平整、建构筑物基础开挖及回填、道路修建等活动,地表裸露、抗侵蚀能力减弱,造成项目区水土流失的主要原因;随着构建筑物的硬化,项目区内排水绿化的实施,水土保持措施功能得到逐渐发挥,水土流失逐渐减少达到稳定状态。

表 5.7 实际水土流失量与方案阶段预测水土流失量对比

项目分区	水土流失量 (t)			
	方案预测	实际监测	变化情况	变化原因
主体工程区	88.2	72.0	-16.2	水土保持方案设计阶段按照最不利因素考虑,实际施工中采取了防护措施,减少了水土流失。
场外临建工程区	0.9	1.9	+1.0	
合计	89.2	73.9	-15.3	

5.3 取土（石、料）、弃土（石、渣）潜在土壤流失量

本工程实际建设过程中，总挖方 16.18 万 m³，填方 29.12 万 m³，无弃方，借方 12.94 万 m³，来自新建柿树岗乡联圩村整村推进项目（联圩安置点）。

5.4 水土流失危害

根据实际调查及监测，本工程在建设过程中，由于项目区的场地平整、建构筑物基础的开挖及回填等土建工程等活动，使地表植被遭到破坏，导致项目区产生一定的水土流失。

根据调查及监测，工程在建设期间未发生重大水土流失事件。

6 水土流失防治效果监测结果

6.1 水土流失治理度

水土流失治理度为项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。本项目水土流失治理面积 11.66hm², 水土流失总面积 11.68hm², 水土流失治理度为 99.8%, 高于方案批复的目标值 95%。水土流失治理度计算见表 6.1。

表 6.1 水土流失治理度计算成果表

监测分区	水土保持措施面积 (hm ²)			硬化面积 (hm ²)	小计 (hm ²)	水土流失面 积 (hm ²)	水土流失治 理度 (hm ²)
	工程 措施	植物措 施	小计				
主体工程区	0.01	3.46	7.37	3.47	10.84	10.86	99.8
场外临建工程区	0.82		0.82		0.82	0.82	100
合计	0.83		8.19	3.47	11.66	11.68	99.8

6.2 土壤流失控制比

土壤流失控制比为项目水土流失责任范围内容许土壤流失量与治理后每平方公里年平均土壤流失量之比。依据《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007), 本工程所在地区属南方红壤区, 容许土壤流失量为 500t/(km²·a), 试运行期平均土壤流失量 122t/(km²·a)。经计算, 试运行期土壤流失控制比为 4.1, 有效的控制了因项目开发建设产生的水土流失。

6.3 渣土防护率

渣土防护率为项目水土流失责任范围内采取措施实际档护的永久弃渣、临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比。根据实地监测和调查, 本工程采取措施挡护的临时堆土数量和永久弃渣 6.80 万 m³, 临时堆土和永久弃渣总量 6.84 万 m³, 渣土防护率为 99.4%。

6.4 表土保护率

表土保护率为项目水土流失责任范围内保护的表土数量占可剥离表土总量的百分比。本项目开工前未进行表土剥离, 表土与一般土石方混合使用, 因此不计表土保护率。

6.5 林草植被恢复率

林草植被恢复率为项目水土流失责任范围内林草类植被面积占可恢复林草植被面积的百分比；至目前本工程已经实施植物措施面积 3.46hm^2 ，占可恢复林草植被面积 3.47hm^2 的 99.7%，高于方案批复的目标值 95%。分区林草植被恢复率计算成果见表 6.2。

表 6.2 林草植被恢复率计算表

防治分区	可恢复面积 (hm^2)	植物措施面积 (hm^2)	林草植被恢复率 (%)
主体工程区	3.47	3.46	99.7
场外临建工程区	0	0	0
合计	3.47	3.46	99.7

6.6 林草覆盖率

林草覆盖率为项目水土流失责任范围内林草类植被面积占总面积的百分比。项目建设区内林草植被面积 3.46hm^2 ，占项目总面积 11.18hm^2 (扣除复垦面积 0.50hm^2) 的 30.9%，高于方案批复的目标值 22%。分区林草覆盖率计算成果见表 6.3。

表 6.3 林草覆盖率计算表

防治分区	项目建设区面积 (hm^2)	林草类植被面积 (hm^2)	林草覆盖率 (%)
主体工程区	10.86	3.46	31.9
场外临建工程区	0.32 (扣除复垦区域面积 0.50hm^2)	0	0
合计	11.18 扣除复垦区域面积 0.50hm^2)	3.46	30.9

6.7 水土流失防治六项指标监测结果

根据监测资料统计计算，新建柿树岗乡新街社区整村推进项目（新街安置点）六项指标值为：水土流失治理度 99.8%，土壤流失控制比 4.1，渣土防护率 99.4%，不涉及表土保护率，林草植被恢复率 99.7%，林草覆盖率 30.9%，均达到方案批复的防治目标，六项指标监测结果见表 6.4。

表 6.4 水土流失防治六项指标监测成果表

序号	项目	单位	目标值	监测值
1	水土流失治理度	%	95	99.8
2	土壤流失控制比	/	1.4	4.1
3	渣土防护率	%	95	99.4
4	表土保护率	%	/	/
5	林草植被恢复率	%	95	99.7
6	林草覆盖率	%	22	30.9



7 结论

7.1 水土流失动态变化

根据监测结果，建设期实际防治责任范围为方案设计的 11.68hm^2 ，较方案增加了 0.22hm^2 ，主要是项目进行土方回填时对围墙外南侧区域进行扰动，主体工程区未发生变化。

工程建设期挖方 16.18万 m^3 ，填方 29.12万 m^3 ，无余方，借方 12.94万 m^3 ，来自新建柿树岗乡联圩村整村推进项目（联圩安置点）。

本工程水土流失主要发生在主体工程区。根据监测结果，水土流失主要集中在 2021~2022 年。本工程共产生土壤流失量 73.9t ，主体工程区水土流失量 72.0t ，占水土流失总量的 97.4% 。

本工程水土保持监测数据从施工期到试运行期通过遥感解译、现场调查获得，在监测过程中，土地整治、排水工程、植被建设工程等防治措施相结合，使扰动土地得到整治，水土流失得到控制，各扰动单元土壤侵蚀强度都呈现下降趋势。截止监测结束时，六项指标均达到方案批复的要求，水土保持措施的防治效果明显。

7.2 水土保持措施评价

1、水土保持工程施工评价

建设单位按照水土保持要求，施工过程中，采取临时苫盖、临时排水、临时绿化等措施，减少水土流失；施工结束后，对裸露区域进行植被建设，植被建设前进行了土地整治，保证了植物措施的成活率；项目区的排水体系，断面尺寸符合设计要求。本工程主体工程施工单位在施工过程中按照设计施工，控制施工边界，减少了对外界的影响。

2、水土保持措施效果评价

本项目水土保持措施布设采取工程措施与植物措施、临时措施相结合，有效的防止了水土流失。土壤侵蚀模数由施工期最大的 $696\text{t}/(\text{km}^2\cdot\text{a})$ 降到试运行期的 $350\text{t}/(\text{km}^2\cdot\text{a})$ ，各项措施控制发挥了很好的防治水土流失的作用，截止目前，各项防护措施效果明显，运行良好。

7.3 存在问题及建议

运行维护单位应进一步加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。

7.4 综合结论

本工程水土保持措施的实施，达到了水土保持方案批复的目标，水土保持设施运行正常，达到了防治水土流失的目的，本项目建设区内扰动土地总面积为 11.68hm^2 ，项目建设期内土壤流失总量为 73.9t 。落实的水土保持防治措施较好地控制和减少了施工过程中的水土流失，各项标均达到水土保持方案批复的防治目标。其中，水土流失治理度 99.8% ，土壤流失控制比 4.1 ，渣土防护率 99.4% ，林草植被恢复率 99.7% ，林草覆盖率 30.9% 。

根据《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161号）规定及要求，本项目不存在弃土乱堆乱弃等现象，工程后期实施了工程措施、植物措施以及临时防护措施等，经综合评价该工程水土保持监测三色评价为“绿色”。

